



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Deęerlendirme	2
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	2
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	2
1.3- 2018 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	3
1.4- 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları	4
2- 2018 Yılı Proje Uygulamaları	5
2.1- Devam Eden Projeler	5
2.2- Tamamlanan Projeler	12
EK-1: 2018 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	16
EK-2: 2018 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	17

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2018 yılında gerçekleşen yatırım harcaması 112.418.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu yatırımın 108.115.000 TL.'si hazine yardımlarıyla, 4.303.000 TL.'si Üniversitemiz öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %96'sını Hazine yardımları, %4'ünü öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 6005 sayılı Kanun ile 14.07.2010 tarihinde kurulmuş; 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi; 26.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi ile Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Üniversitemize bağlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi olmak üzere 19 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 6 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde halen 26.242 lisans, 3.898 ön lisans, 5.651 yüksek lisans ve 833 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 36.624 öğrenci öğrenim görmekte; 1.832 akademik, 1.156 idari, 347 işçi olmak üzere toplam 3.335 kadrolu personel hizmet vermektedir.

1.3- 2018 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Konya'nın 2. Devlet Üniversitesi olarak 2010 yılında kurulan Üniversitemiz çok yerleşkeli bir yapıya sahiptir. Üniversitemizin bazı birimleri kendilerine ait kalıcı binalarda hizmet vermekte iken, bazı birimleri şehrin muhtelif yerlerinde tahsis edilen binalar ile kiralanan binalarda hizmet vermektedirler. Bu nedenle Üniversitemizin öncelikli hedefleri Köyceğiz Kampüsünde kalıcı binalar inşa etmek ve kampüs altyapı işlerini tamamlamak olmuştur.

Eğitim sektöründe 2018 yıl sonu itibariyle;

- 2015 yılında yapımına başlanılan Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (25.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %100'e,
- 2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (40.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %11'e,
- 2015 yılında yapımına başlanılan Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %75'e,
- 2017 yılında yapımına başlanılan Kampüs Altyapı 1. Kısım İkmal inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %85'e,
- 2018 yılında yapımına başlanılan Diş Hekimliği Fakültesi İkmal (10.800 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı %9'a ulaşmıştır.

Ayrıca yıl içinde mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin bazı bloklarının ekonomik ömrünü doldurmuş olması, bazı bloklarının ise fiziki şartlarının yetersiz olması nedenleriyle, ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından yapılan ve 2014 yılında yapımına başlanılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatının fiziki gerçekleşme oranı 2018 yılında %100'e ulaşmış ve yeni hastane binaları hizmet vermeye başlamıştır.

Ayrıca yıl içinde hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

2018 yılı yatırım programı kapsamında Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2018 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2018 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 117.400.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 18.650.000 TL. artışla toplam ödenek 136.050.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %16 olmuştur. Yıl içinde toplam 112.418.000 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 45.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 8.650.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 53.650.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %19'dur. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 44.861.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %84 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 70.000.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 10.000.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 80.000.000 TL. 'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %14'tür. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 65.157.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %81 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 2.400.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan proje için yıl içinde toplam 2.400.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2018 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2011H037160 (KOP)
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Sos.Beş.Bil. Fak.(25.000 m2) Mühendislik Fak.(57.000 m2)
Başlama-Bitiş	2011-2020
Maliyeti	145.189.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 36.200.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Projeden Kampüs Altyapısı Projesine 17.591.000 TL., Muhtelif İşler Projesine 1.214.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 17.395.000 TL. olmuştur.</p> <p>Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (25.000 m2): İhalesi 10.12.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 12.02.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 41.252.800 TL. olan iş için 2018 yılında 2.344.577,01 TL ödeme yapılarak tamamlanmış, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi binası hizmete alınmıştır.</p> <p>Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (40.000 m2): İhalesi 15.05.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 15.07.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 60.121.000 TL. olan iş için 2018 yılında 629.487,27 TL. ödeme yapılmıştır. Ancak yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi üzerine sözleşme feshedilmiştir. Fiziki gerçekleşmesi %11 olan işin tamamlanması için 28.11.2018 tarihinde ikmal ihalesi yapılmıştır.</p> <p>Mühendislik Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı İşi (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 32.343.800 TL. olan iş için 2018 yılında 6.588.601,14 TL. ödeme yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %75 olmuştur.</p> <p>Böylece 2018 yılında bu proje için toplam 9.562.665,42 TL. harcama yapılmış ve toplam ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %55 olmuştur.</p>

Resim-1,2: Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Binası



Resim-3,4: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İdari ve Derslik Blokları



Resim-5,6: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Laboratuvar Blokları



Sektör	Eğitim
Proje No	2013H031390
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Etüt-Proje, Müşavirlik
Başlama-Bitiş	2013-2019
Maliyeti	3.229.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 100.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır.</p> <p>Ahmet Keleşoğlu Kampüsü İlahiyat Fakültesi Trafo ve Jeneratör Projesi Çizim İşi yaptırılmış ve bu iş için 4.720,00 TL. ödeme yapılmıştır.</p> <p>Diş Hekimliği Fakültesi Mekanik ve Elektrik Tesisatı Proje Hazırlama İşi yaptırılmış ve bu iş için 27.140,00 TL. ödeme yapılmıştır.</p> <p>Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bloklarının Elektrik Revize Projesi Yapılması ve G Blok (Ek Bina) Mekanik Tesisat-Elektrik Tesisat Projesi Yapım İşi yaptırılmış ve bu iş için 49.560,00 TL. ödeme yapılmıştır.</p> <p>Böylece 2018 yılında bu proje için toplam 81.420,00 TL. harcama yapılmış ve ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %81 olmuştur.</p>

Resim-7: Köyceğiz Kampüsü



Sektör	Eğitim
Proje No	2012H032390
Proje Adı	Kampüs Altyapısı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama-Bitiş	2012-2019
Maliyeti	30.564.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 4.400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 17.591.000 TL. ödenek aktarılmıştır. Böylece projenin revize ödeneği 21.991.000 TL. olmuştur.</p> <p>Kampüs Altyapı Birinci Kısım İkmal İnşaatı Yapım İşi: İhalesi 26.01.2017 tarihinde yapılan, sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 24.828.934,60 TL. olan iş için yıl içinde 21.276.934,26 TL. harcama yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı %85 olmuştur. İş kapsamında yaklaşık 4.500 metre 4 şeritli asfalt yol, 50 metre uzunluğunda 20 metre açıklığında köprü, 1 adet dağıtım trafosu, 9.500 metre tretuvar bordürü, 3.600 metre kanalizasyon hattı, 3.200 metre yağmursuyu hattı, 1.200 metre galeri hattı, 900 metre su hattı, 5.500 metre doğalgaz hattı, 360 metre betonarme menfez, 680 metre betonarme duvar, 460 metre taş duvar, 10.200 metre XLPE (orta gerilim) kablo, 8.000 metre fiber optik kablo imalatları ile birlikte yaklaşık 970.000 m3 toprak hareketliliği (yarma/dolgu) gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Ayrıca ihalesi 19.06.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 13.07.2018 tarihinde imzalanan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Trafo, Jeneratör ve UPS Yapım İşi için 713.558,47 TL. ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır.</p> <p>Böylece 2018 yılında bu proje için toplam 21.990.492,73 TL. harcama yapılmış ve ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p>

Resim-8: Kampüs Altyapısı



Sektör	Sağlık
Proje No	2013I000440
Proje Adı	Hastane İnşaatı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (96.500 m ²), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2013-2019
Maliyeti	260.213.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 60.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 9.650.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 69.650.000 TL. olmuştur.</p> <p>Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi: İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.660 TL. olan iş için 2018 yılında TOKİ'ye 33.882.969,30 TL. ödeme yapılmıştır. Hastane inşaatı 2018 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmıştır.</p> <p>Proje kapsamında, yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 26.907.961,99 TL. harcama yapılmıştır. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Katı Atık Merkezi Yapım İşi: İhalesi 12.03.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 11.04.2018 tarihinde imzalanan iş için yıl içinde 549.680,81 TL. ödeme yapılarak iş tamamlanmıştır.</p> <p>Böylece 2018 yılında bu proje için toplam 61.340.612,10 TL. harcama yapılmış ve ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %88 olmuştur.</p>

Resim-9,10: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi



Sektör	Sağlık
Proje No	2016I000391
Proje Adı	Diş Hekimliği Hastanesi (KOP) Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (10.800 m ²) Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2016-2019
Maliyeti	20.000.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 6.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Proje yıl içinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Diş Hekimliği Hastanesi projesi olarak revize edilmiştir.</p> <p>Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi İkmal İnşaatı Yapım İşi: İhalesi 06.08.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.10.2018 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 16.204.940 TL. olan iş için yıl içinde 1.504.962,88 TL. ödeme yapılmış ve işin tamamlanma oranı %9 olmuştur.</p> <p>Böylece projenin 2018 yılı ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %25 olmuştur.</p>

Resim-11: Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi



Sektör	Sağlık
Proje No	2018I000050
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Büyük Onarım
Başlama-Bitiş	2018-2018
Maliyeti	4.000.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 4.000.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.000.000 TL'si hazine yardımı gelirlerinden, 2.000.000 TL'si döner sermaye kaynaklarından oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 350.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 4.350.000 TL. olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında Meram Tıp Fakültesi Hastanesi eski bloklarının büyük onarımları için 2.314.069,27 TL. harcama yapılmıştır.</p> <p>Böylece 2018 yılı özel bütçe ödeneğinin nakdi gerçekleşme oranı %98 olmuştur.</p>

Resim-12: Sağlık Bilimleri Fakültesi



2.2- Tamamlanan Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2018H035540
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2018-2018
Maliyeti	3.800.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 3.800.000 TL. olup, bu ödeneğin 2.000.000 TL.'si hazine yardımı gelirlerinden, 1.800.000 TL.'si öz gelirlerden oluşmaktadır. Proje ödeneğine yıl içerisinde Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarma yoluyla 5.000.000 TL., Derslik ve Merkezi Birimler projesinden 1.214.000 TL. ödenek aktarılmış; net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 3.390.000 TL. ödenek eklenmiştir. Böylece projenin revize ödeneği 13.404.000 TL. olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları için 6.184.868 TL., bina bakım onarımları için 4.656.789 TL., bilgisayar yazılımı ve lisans alımları için 416.515 TL. harcama yapılmıştır. Ayrıca önceki yıllarda tamamlanmış yapım işlerinin kesin hesapları kapsamında, Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi için 758.362,78 TL., Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Ek Derslik Binası Yapım İşi için 455.369,53 TL. ödeme yapılmıştır.</p> <p>Böylece bu proje için 2018 yılında toplam 12.471.906,61 TL. harcama yapılmış ve ödeneğin nakdi gerçekleştirme oranı %93 olmuştur.</p>

Resim-13: 15 Temmuz Kampüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Onarım İşi



Sektör	Eğitim
Proje No	2018H035320
Proje Adı	Yayın Alımı (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama-Bitiş	2018-2018
Maliyeti	500.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden oluşmaktadır. Yıl içinde net finansman fazlası likit karşılığı ekleme yoluyla 260.000 TL. ödenek eklenmiş ve projenin revize ödeneği 760.000 TL. olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları için 757.348,36 TL. harcama yapılmıştır.</p> <p>Böylece ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p>


Sektör	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No	2018K120460
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (KOP)
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Proje Desteği
Başlama-Bitiş	2018-2018
Maliyeti	2.400.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2018 yılı ödeneği 2.400.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden oluşmaktadır.</p> <p>Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.</p> <p>Projenin nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p>

Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H035540			2018H035540		
Proje Adı	Muhtelif İşler (KOP)			Muhtelif İşler (KOP)		
Sektör/Altsektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz eğitim öğretim birimlerinin binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımları, bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz eğitim öğretim birimlerinin binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımları, bilgi ve iletişim teknolojileri ve makine teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018			2018-2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	3.800	-	-	13.404	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)	-	12.471	-	-	12.471	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018H035320			2018H035320		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Altsektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018			2018-2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	500	-	-	760	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)	-	757	-	-	757	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (Bin TL.)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2018K120460			2018K120460		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. (KOP)			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj. (KOP)		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2018-2018			2018-2018		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.400	-	-	2.400	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2018 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2018)	-	2.400	-	-	2.400	-

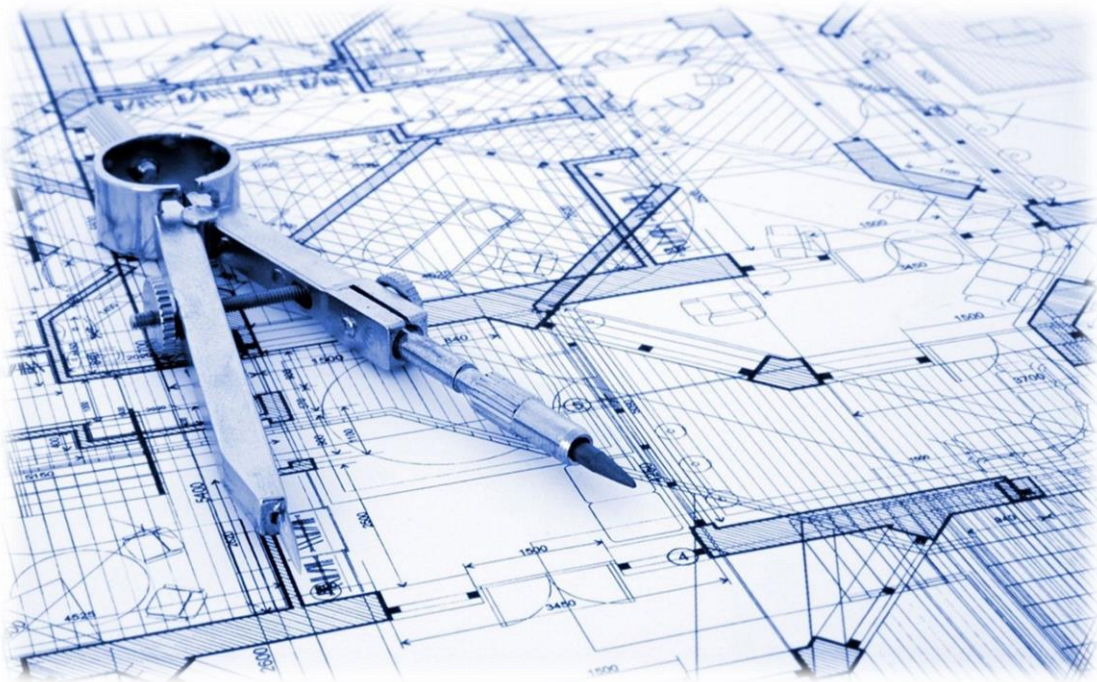

2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU
(4. Dönem-Aralık Sonu)

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bütçe Türü : Özel Bütçe

2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2017 Sonu Kümülatif Harcama			2018 Yılı Program Ödenek			2018 Yılı Revize Ödenek			2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna		Kredi	Özkayna	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma-Hab															
Turizm															
Konut															
Eğitim	5	-	183.282	-	-	86.470	-	-	45.000 (1.800)	-	-	53.650 (1.940)	-	-	44.861 (1.903)
Sağlık	3	-	284.213	-	-	172.825	-	-	70.000	-	-	80.000	-	-	65.157
D.Kamu Hizmetleri															
-İktisadi															
-Sosyal	1	-	2.400	-	-	0	-	-	2.400 (2.400)	-	-	2.400 (2.400)	-	-	2.400 (2.400)
TOPLAM	9	-	469.895	-	-	259.295	-	-	117.400 (4.200)	-	-	136.050 (4.340)	-	-	112.418 (4.303)

NOT: Parantez içindeki tutarlar, öz gelir karşılığı ödenek ve harcama tutarlarıdır.

2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Eğitim

2018 4. Dönem Sonu Yılı İçeri Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)
309443	989	2011H037160	Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (KOP) Mühendislik Fakültesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2020 2018 2020	Konya	0	145.189 48.189 97.000	74.479 48.187 26.292	0	0	36.200 2 36.198	(-) (+) (-)	18.805 2.343 21.148	0 Prj.Arası Aktarma Prj.Arası Aktarma Prj.Arası Aktarma	0 0 0
309377	989	2012H032390	Kampüs Altyapısı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	30.564	10.063	0	0	4.400	(+)	17.591	Prj.Arası Aktarma Prj.Arası Aktarma	0 0
309349	989	2013H031390	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	3.229	1.928	0	0	100				0 0
309410	989	2018H035320	Yayın Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	500	0	0	0	500	(+)	260	Likit Likit	0 0
309389	989	2018H035540	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	3.800	0	0	0	3.800	(+)	9.604	Likit Likit Likit Yedek Likit Likit Likit Likit Likit Likit Prj.Arası Aktarma	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
			(ÖZ GELİR)							(0)	(0)	(1.800)			(0)	(0)
TOPLAM							0	183.282	86.470	0	0	45.000	(+)	8.650	0	0

2018 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

DÖNEM= 4

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Sektör Adı : Sağlık

2018 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2017 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)
314050	989	2013I000440	Hastane İnşaatı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	260.213	172.825	0	0	60.000	(+)	9.650	0	0
			İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Konya	0	190.213	155.213	0	0	35.000			0	0
			Makina ve Teçhizat Alımı (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	70.000	17.612	0	0	25.000	(+)	9.650	0	0
														(21.12.2018: 9650)	Likit	
303831	989	2016I000391	Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	20.000	0	0	0	6.000			0	0
			İnşaat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	15.340	0	0	0	6.000			0	0
			Makine-Teçhizat (KOP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Konya	0	4.660	0	0	0	0			0	0
318116	989	2018I000050	Muhtelif İşler (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2018	Konya	0	4.000	0	0	0	4.000	(+)	350	0	0
										(0)	(0)	(2.000)			(0)	(0)
														(21.12.2018: 350)	Likit	
TOPLAM							0	284.213	172.825	0	0	70.000	(+)	10.000	0	0

Sektör Adı : DKH - Sosyal

2018 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1)	YSK (2)	Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tut. Dış (8)	Proje Tut. Toplam (9)	2016 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Dış Kredi (11)	Ödenek Dış Özkaynak (12)	Ödenek Toplam (13)	+ / - (14)	Aktarma Mik. (15)	Harcama Dış Kredi (16)	Harcama Dış Özkaynak (17)
301471	989	2018K120460	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj. (KOP)	ÖZEL BÜTÇE (ÖZ GELİR)	2018	Konya	0	2.400	0	0	0	2.400			0	0
										0	0	(2.400)				
TOPLAM							0	2.400	0	0	0	2.400			0	0

GENEL TOPLAM							0	469.895	259.295	0	0	117.400	(+)	18.650	0	0
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	----------------	----------	----------	----------------	------------	---------------	----------	----------
