



# NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



## 2021 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

# İÇİNDEKİLER

<b>1- Genel Deęerlendirme</b>	<b>3</b>
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	3
1.3- 2021 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
1.4- 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
<b>2- 2021 Yılı Proje Uygulamaları</b>	<b>6</b>
2.1- Devam Eden Projeler	6
2.2- Tamamlanan Projeler	10
2.3- Proje Tamamlama Raporları	14
<b>EK-1: 2021 Yılı Yatırımları Özet Tablosu</b>	<b>17</b>
<b>EK-2: 2021 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu</b>	<b>18</b>

## 1- Genel Değerlendirme

### 1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2021 yılında gerçekleşen toplam yatırım harcaması 104.315.437 TL.'dir. Bu yatırımın 101.614.437 TL.'si hazine yardımlarıyla, 2.701.000 TL.'si Üniversitemizin öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %97,4'ünü Hazine yardımları, %2,6'sını öz gelirler oluşturmuştur.

### 1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2010 yılında 6005 sayılı Kanunla Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş; 2011 yılında 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemize bağlanmış; 2012 yılında 6287 sayılı Kanunla Üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi olmak üzere 20 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 8 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 27.359 lisans, 3.343 ön lisans, 5.918 lisans üstü öğrencisi olmak üzere toplam 36.620 öğrenci öğrenim görmekte; 2.091 akademik, 1.787 idari, 610 işçi olmak üzere toplam 4.488 personel hizmet vermektedir.

### **1.3- 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:**

#### **→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü**

- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (45.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı, 2021 yılında %57'den %81'e yükselmiştir.
- Yapımına 2015 yılında başlanılan Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları (17.000 m2) inşaatının fiziki gerçekleşme oranı, 2021 yılında %72'den %79'a yükselmiştir.
- Yıl içinde, kampüs altyapı çalışmalarına devam edilmiş, mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

#### **→ Sağlık Sektörü**

- Yıl içinde, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni binasına kantin yaptırılmış, Hastane ile Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yaptırılmıştır.

#### **→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü**

- Yıl içinde, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

## 1.4- 2021 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım programında yer alan 9 adet projenin toplam program ödeneği 93.571.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 16.000.000 TL. artışla toplam ödenek 109.571.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %17 olmuştur. Yıl içinde toplam 104.315.437 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

### → Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 56.250.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 16.000.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 72.250.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %28'dir. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 71.467.321 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %99 olmuştur.

### → Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 3 adet projenin program ödeneği 35.500.000 TL.'dir. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 31.027.116 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %87 olmuştur.

### → DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 1.821.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan proje için yıl içinde toplam 1.821.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

## 2- 2021 Yılı Proje Uygulamaları

### 2.1- Devam Eden Projeler

<b>Sektör</b>	Eğitim
<b>Proje No</b>	2011H03-1423
<b>Proje Adı</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Mühendislik Fak.(62.000 m2)
<b>Başlama-Bitiş</b>	2011-2022
<b>Maliyeti</b>	172.663.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 46.900.000 TL olup, yıl içerisinde yapılan revizeyle 60.900.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 60.324.419 TL.'si harcanmış ve 2021 yılı nakdi gerçekleşmesi %99 olmuştur.</p> <p>Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (45.000 m2): Önceki ihale sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2021 yılında 27.140.969 TL. ödeme yapılmıştır. İnşaatın fiziki gerçekleşme oranı %81'e ulaşmıştır.</p> <p>Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 32.343.000 TL. olan işin yüklenicisi taahhüdünü yerine getirmediği için 2021 yılında feshedilmiştir. Laboratuvar C Blok ikmal inşaatının ihalesi 21.04.2021 tarihinde yapılmış, yıl içinde toplam 4.307.403 TL. harcama yapılarak iş tamamlanmıştır. Laboratuvar Bloklarının fiziki gerçekleşme oranı %79'a ulaşmıştır.</p>

**Resim 1-2:** Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları





**Resim 3:** Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları



<b>Sektör</b>	Eğitim
<b>Proje No</b>	2021H03-168312
<b>Proje Adı</b>	Kampüs Altyapısı
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2023
<b>Maliyeti</b>	7.000.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 1.400.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 2.050.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 2.030.192 TL.'si harcanmış ve 2021 yılı nakdi gerçekleşmesi %99 olmuştur.</p> <p>İhalesi 2021 yılında yapılan, sözleşmesi 26.07.2021 tarihinde imzalanan Köyceğiz Yerleşkesi Çevre Aydınlatma İşi için 1.757.311 TL. harcama yapılarak iş tamamlanmıştır. Ayrıca Köyceğiz Yerleşkesinde ihtiyaç duyulan diğer altyapı işleri için 272.881 TL. harcama yapılmıştır.</p>

Resim 4-5: Köyceğiz Yerleşkesi Yol ve Aydınlatma

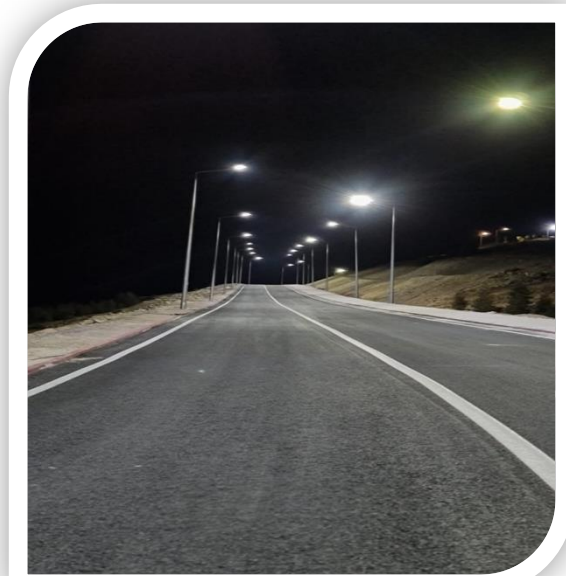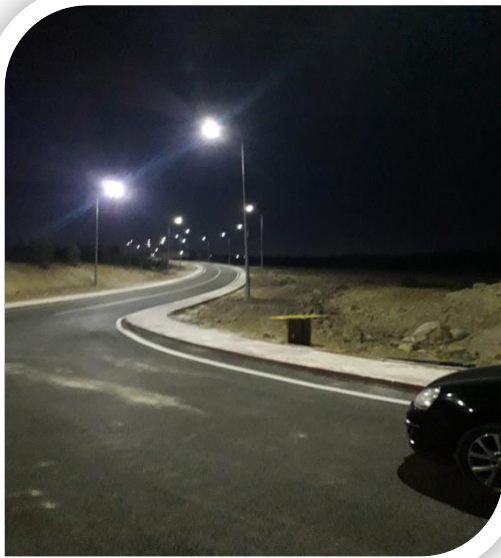



<b>Sektör</b>	Sağlık
<b>Proje No</b>	2013I00-1855
<b>Proje Adı</b>	Hastane İnşaatı
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Hastane İnşaatı (96.500 m <sup>2</sup> ), (600 yatak), Makine-Teçhizat
<b>Başlama-Bitiş</b>	2013-2022
<b>Maliyeti</b>	311.094.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 24.200.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 24.700.000 TL olmuştur. Yıl içinde toplam 22.182.113 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %90 olmuştur.</p> <p>İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.660 TL. olan “Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 2021 yılında TOKİ’ye 6.338.894 TL. ödeme yapılmıştır. Yeni hastane binası tamamlanarak hizmete alınmış olup, TOKİ’ye olan ödemeler devam etmektedir.</p> <p>Yeni hastane binası kantin inşaatının ihalesi 15.04.2021 tarihinde yapılmış, yıl içinde toplam 3.346.147 TL. harcama yapılarak iş tamamlanmıştır.</p> <p>Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2021 yılında 12.497.072 TL harcama yapılmıştır.</p>

Resim 6-7: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Bina



## 2.2- Tamamlanan Projeler

<b>Sektör</b>	Eğitim
<b>Proje No</b>	2021H03-169660
<b>Proje Adı</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Etüt-Proje
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2021
<b>Maliyeti</b>	200.000 TL.
<b>Açıklama</b>	Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 200.000 TL.'dir. Bu ödeneğin 27.966 TL.'si harcanarak ihtiyaç duyulan etüt-projeler yaptırılmış ve nakdi gerçekleşmesi %14 olmuştur.


<b>Sektör</b>	Eğitim
<b>Proje No</b>	2021H03-168315
<b>Proje Adı</b>	Yayın Alımı
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2021
<b>Maliyeti</b>	750.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizeyle 1.750.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 1.748.791 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır.</p>

<b>Sektör</b>	Eğitim
<b>Proje No</b>	2021H03-168317
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2021
<b>Maliyeti</b>	7.000.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı ödeneği 3.098.000 TL. olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 7.350.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 7.335.953 TL.si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları, bina bakım onarımları, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmıştır.</p>

<b>Sektör</b>	Sağlık
<b>Proje No</b>	2021I00-160039
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Büyük Onarım
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2021
<b>Maliyeti</b>	6.000.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 6.000.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizeyle 5.500.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 3.713.410 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %68 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında yapılan harcamalarla hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.</p>

<b>Sektör</b>	Sağlık
<b>Proje No</b>	2016I00-2741
<b>Proje Adı</b>	Diş Hekimliği Hastanesi
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Hastane İnşaatı (10.800 m <sup>2</sup> ) Makine-Teçhizat
<b>Başlama-Bitiş</b>	2016-2021
<b>Maliyeti</b>	31.997.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı yatırım programındaki ödeneği 5.300.000 TL.'dir. Yıl içinde toplam 5.131.593 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %97 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında yapılan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı 2020 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 2021 yılında, 5.131.593 TL. harcanarak yeni binada ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları yapılmıştır.</p>

Resim 8-9-10: Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi

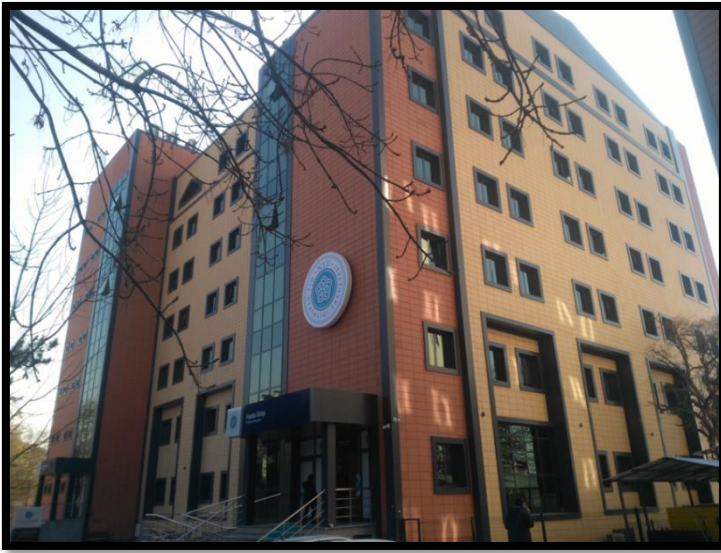

<b>Sektör</b>	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
<b>Proje No</b>	2021K12-168339
<b>Proje Adı</b>	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
<b>Proje Yeri</b>	Konya
<b>Karakteristik</b>	Proje Desteği
<b>Başlama-Bitiş</b>	2021-2021
<b>Maliyeti</b>	1.821.000 TL.
<b>Açıklama</b>	<p>Projenin 2021 yılı ödeneği 1.821.000 TL.'dir. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.</p>

## 2.3- Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-169660			2021H03-169660		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.			İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Etüt-proje			Etüt-proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021			2021-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	200.000	-	-	200.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2021	-	27.966	-	-	27.966	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-168315			2021H03-168315		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021			2021-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	750.000	-	-	1.750.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)	-	1.748.791	-	-	1.748.791	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-168317			2021H03-168317		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021			2021-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	7.000.000	-	-	7.350.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)	-	7.335.953	-	-	7.335.953	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2016I000391			2016I00-2741		
Proje Adı	Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi			Dış Hekimliği Hastanesi		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Hematoloji ve onkoloji hastanesi olarak 10.800 m2 kapalı alana sahip yeni bina inşa etmek ve makine teçhizat alımını gerçekleştirmek.			Dış Hekimliği Fakültesi için 10.800 m2 kapalı alana sahip yeni bina inşa etmek ve makine teçhizat alımını gerçekleştirmek.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Hastane inşaatı (10.800 m2), Mak.teç.			Hastane inşaatı (10.800 m2), Mak.teç.		
Başlama-Bitiş Tarihi	2016-2018			2016-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaşt.
	-	20.000.000	-	-	31.997.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2016)	-	-	-	-	-	-
(2017)	-	-	-	-	-	-
(2018)	-	-	-	-	-	-
(2019)	-	8.993.351	-	-	11.059.211	-
(2020)	-	17.703.946	-	-	19.465.581	-
(2021)	-	5.131.593	-	-	5.131.593	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021I00-160039			2021I00-160039		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.			Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Büyük Onarım			Büyük Onarım		
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021			2021-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	6.000.000	-	-	5.500.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)	-	3.713.410	-	-	3.713.410	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021K12-168339			2021K12-168339		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2021-2021			2021-2021		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	1.821.000	-	-	1.821.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2021 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)	-	1.821.000	-	-	1.821.000	-



## 2021 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2020 Sonu Kümülatif Harcama	2021 Yılı Program Ödenek	2021 Yılı Revize Ödenek	2021 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
Tarım						
Madencilik						
İmalat						
Enerji						
Ulaştırma-Hab.						
Turizm						
Konut						
Eğitim	5	187.613.000	89.000.000	56.250.000	72.250.000	71.467.321
Sağlık	3	349.091.000	282.250.000	35.500.000	35.500.000	31.027.116
D.Kamu Hizm.						
-İktisadi						
-Sosyal	1	1.821.000	0	1.821.000	1.821.000	1.821.000
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>538.525.000</b>	<b>371.250.000</b>	<b>93.571.000</b>	<b>109.571.000</b>	<b>104.315.437</b>

## 2021 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2020 Kümülatif Harcama	2021 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2021 Revize Ödenek	2021 Harcama
2011H03-1423	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	172.663.000	89.000.000	46.900.000	14.000.000		60.900.000	60.324.419
<i>Alt Proje</i>	<i>Mühendislik Fakültesi</i>		2022		<i>172.663.000</i>	<i>89.000.000</i>	<i>46.900.000</i>	<i>9.000.000</i> <i>5.000.000</i>	<i>Yatırımları Hızlandırma Öd.Akt.</i> <i>Likit Ekleme</i>	<i>55.900.000</i>	<i>60.324.419</i>
2021H03-168312	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Konya	7.000.000	0	1.400.000	650.000	K.İç Aktarma (+)	2.050.000	2.030.192
2021H03-169660	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	200.000	0	200.000			200.000	27.966
2021H03-168315	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	750.000	0	750.000	1.000.000	Likit Ekleme	1.750.000	1.748.791
2021H03-168317	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	7.000.000	0	7.000.000	350.000 1.000.000 -650.000	Likit Ekleme K.İç Aktarma (-)	7.350.000	7.335.953
<b>TOPLAM</b>					<b>187.613.000</b>	<b>89.000.000</b>	<b>56.250.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>72.250.000</b>	<b>71.467.321</b>

## 2021 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2020 Kümülatif Harcama	2021 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2021 Revize Ödenek	2021 Harcama
2013I00-1855	Hastane İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2022	Konya	311.094.000	255.553.000	24.200.000 (2.200.000)	500.000		24.700.000	22.182.113
Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE (DÖNER SERM.)	2022	Konya	222.465.000	190.924.000	12.200.000 (2.200.000)			12.200.000	9.685.041
Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	88.629.000	64.629.000	12.000.000	500.000	K.İçer Aktarma (+)	12.500.000	12.497.072
2016I00-2741	Diş Hekimliği Hastanesi	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	31.997.000	26.697.000	5.300.000	0		5.300.000	5.131.593
Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	19.247.000	18.747.000	500.000	-230.000	K.İçer Aktarma (+)	270.000	101.652
Alt Proje	Makine-Teçhizat	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	12.750.000	7.950.000	4.800.000	230.000	K.İçer Aktarma (-)	5.030.000	5.029.941
2021I00-160039	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	6.000.000	0	6.000.000	-500.000	K.İçer Aktarma (-)	5.500.000	3.713.410
<b>TOPLAM</b>					<b>349.091.000</b>	<b>282.250.000</b>	<b>35.500.000</b>	<b>0</b>		<b>35.500.000</b>	<b>31.027.116</b>

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2020 Kümülatif Harcama	2021 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2021 Revize Ödenek	2021 Harcama
2020K12-168339	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL BÜTÇE	2021	Konya	1.821.000	0	1.821.000			1.821.000	1.821.000
<b>TOPLAM</b>					<b>1.821.000</b>	<b>0</b>	<b>1.821.000</b>	<b>0</b>		<b>1.821.000</b>	<b>1.821.000</b>

<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>538.525.000</b>	<b>371.250.000</b>	<b>93.571.000</b>	<b>16.000.000</b>		<b>109.571.000</b>	<b>104.315.437</b>
---------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------	--------------------
