



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

1- Genel Deęerlendirme	3
1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:	3
1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:	3
1.3- 2022 Yılında Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	4
1.4- 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	5
2- 2022 Yılı Proje Uygulamaları	6
2.1- Devam Eden Projeler	6
2.2- Tamamlanan Projeler	9
2.3- Proje Tamamlama Raporları	13
EK-1: 2022 Yılı Yatırımları Özet Tablosu	16
EK-2: 2022 Yılı Yatırım Gerçekleşme Raporu	17

1- Genel Değerlendirme

1.1- Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Üniversitemizin 2022 yılında gerçekleşen toplam yatırım harcaması 143.612.289 TL.'dir. Bu yatırımın 140.564.956 TL.'si hazine yardımlarıyla, 3.047.333 TL.'si Üniversitemizin öz gelirleriyle finanse edilmiştir. Böylece toplam finansmanın %97,9'unu Hazine yardımları, %2,1'ini öz gelirler oluşturmuştur.

1.2- Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

Üniversitemiz 2010 yılında 6005 sayılı Kanunla Konya Üniversitesi adıyla kurulmuş; 2011 yılında 2011/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Selçuk Üniversitesi bünyesinde yer alan Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi ile Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Üniversitemize bağlanmış; 2012 yılında 6287 sayılı Kanunla Üniversitemizin adı Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz bünyesinde halen;

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Ereğli Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi, Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Veteriner Fakültesi olmak üzere 20 fakülte;

Yabancı Diller Yüksekokulu olmak üzere 1 yüksekokul;

Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu, Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu, Ereğli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Meram Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Seydişehir Meslek Yüksekokulu ile Seydişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 9 meslek yüksekokulu;

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere 4 enstitü;

Ayrıca Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı bulunmaktadır.

Üniversitemizde 27.533 lisans, 3.693 ön lisans, 7.956 lisans üstü öğrencisi olmak üzere toplam 39.182 öğrenci öğrenim görmekte; 2.046 akademik, 1.843 idari, 621 işçi olmak üzere toplam 4.510 personel hizmet vermektedir.

1.3- 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

- Yapımına 2015 yılında başlanılan, 2021 yılı sonunda fiziki gerçekleştirme oranı %81 olan Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları (45.000 m2) inşaatı 2022 yılında tamamlanmıştır.
- Yapımına 2021 yılında başlanılan, Mühendislik Fakültesi Laboratuvar C Blok Birinci Parça İkmal İnşaatı 2022 yılında tamamlanmıştır.
- Yıl içinde, kampüs altyapı çalışmalarına devam edilmiş, etüt-proje işleri ile mevcut binalarda ihtiyaç duyulan büyük onarımlar yaptırılmış, başta yeni kurulan birimler olmak üzere tüm birimlerin makine-teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım, laboratuvar cihazı, basılı ve elektronik yayın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli alımlar yapılmıştır.

→ Sağlık Sektörü

- Yıl içinde, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ile Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz alımları gerçekleştirilmiş, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım onarımlar yaptırılmıştır.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

- Yıl içinde, Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleri desteklenmiştir.

1.4- 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemizin 2022 yılı yatırım programında yer alan 8 adet projenin toplam program ödeneği 92.346.000 TL.'dir. Yıl içinde yapılan 111.570.000 TL. artışla toplam ödenek 203.916.000 TL.'ye ulaşmıştır. Yatırım ödeneğindeki artış oranı %120 olmuştur. Yıl içinde toplam 143.612.289 TL. yatırım harcaması yapılmış ve %70 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

→ Eğitim / Yükseköğretim Sektörü

Sektörde yer alan 5 adet projenin toplam program ödeneği 53.950.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 70.685.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 124.635.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %130'dur. Eğitim sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 103.064.592 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %83 olmuştur.

→ Sağlık Sektörü

Sektörde yer alan 2 adet projenin program ödeneği 36.340.000 TL. iken, yıl içinde yapılan 40.885.000 TL. artışla sektörün toplam revize ödeneği 77.225.000 TL.'ye ulaşmıştır. Program ödeneğindeki artış oranı %112'dir. Sağlık sektöründe yer alan projeler için yıl içinde toplam 38.491.697 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %50 olmuştur.

→ DKH Sosyal / Teknolojik Araştırma Sektörü

Sektörde yer alan 1 adet projenin program ödeneği 2.056.000 TL.'dir. DKH-Sosyal sektöründe yer alan proje için yıl içinde toplam 2.056.000 TL. harcama yapılmış ve sektörel nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.

2- 2022 Yılı Proje Uygulamaları

2.1- Devam Eden Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2011H03-1423
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Mühendislik Fak.(62.000 m2)
Başlama-Bitiş	2011-2022
Proje Tutarı	208.530.000 TL. (Revize: 266.160.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 40.000.000 TL olup, yıl içerisinde yapılan revizeyle 97.630.000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 78.046.466 TL.'si harcanmış ve 2022 yılı nakdi gerçekleşmesi %80 olmuştur.</p> <p>Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları İkmal İnşaatı ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (45.000 m2): Önceki ihale sözleşmesinin feshedilmesi üzerine yeni ihalesi 28.11.2018 tarihinde yapılan, sözleşmesi 28.01.2019 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 124.962.000 TL. olan iş için 2022 yılında 76.959.167 TL. ödeme yapılmış ve iş tamamlanmıştır.</p> <p>Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (17.000 m2): İhalesi 30.09.2015 tarihinde yapılan, sözleşmesi 14.12.2015 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 32.343.000 TL. olan işin yüklenicisi taahhüdünü yerine getirmediği için 2021 yılında feshedilmiştir. İhalesi 21.04.2021 tarihinde yapılan Laboratuvar C Blok ikmal inşaatı için 2022 yılında 1.087.299 TL. harcama yapılmış ve iş tamamlanmıştır. Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Bloklarının fiziki gerçekleşme oranı %79'a ulaşmıştır.</p>

Resim 1-2: Mühendislik Fakültesi İdari ve Derslik Blokları





Resim 3: Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Blokları



Sektör	Eğitim
Proje No	2021H03-168312
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı
Başlama-Bitiş	2021-2022
Proje Tutarı	7.000.000 TL. (Revize: 6.615.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 3.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 2.615.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 1.519.239 TL.'si harcanmış ve 2022 yılı nakdi gerçekleşmesi %58 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında Üniversitemiz yerleşkelerinde ihtiyaç duyulan altyapı ve çevre düzenleme işleri yaptırılmıştır.</p>

Resim 4-5: Köyceğiz Yerleşkesi Yol ve Aydınlatma

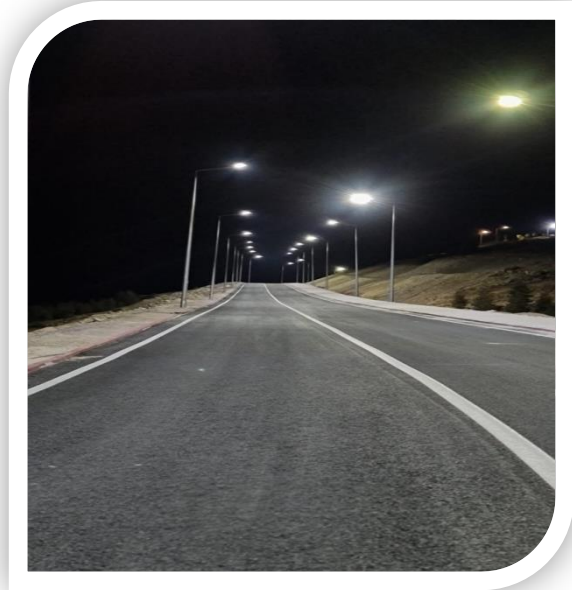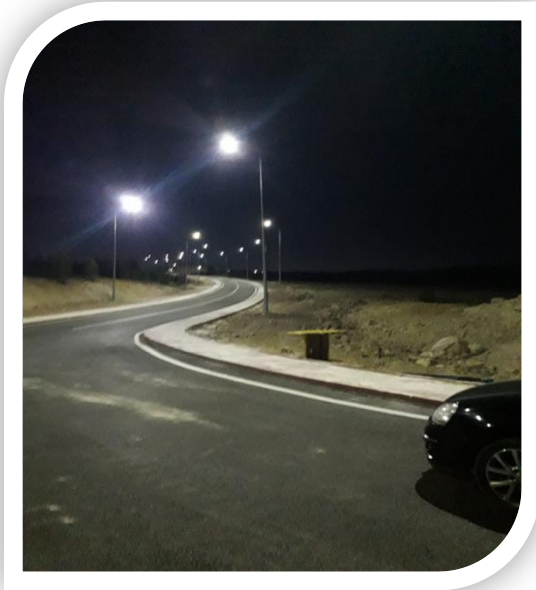

2.2- Tamamlanan Projeler

Sektör	Eğitim
Proje No	2022H03-186879
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama-Bitiş	2022-2022
Proje Tutarı	200.000 TL. (Revize: 585.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 200.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 585.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 292.758 TL.'si harcanmış ve 2022 yılı nakdi gerçekleşmesi %50 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında ihtiyaç duyulan etüt ve proje işleri yaptırılmıştır.</p>

Sektör	Eğitim
Proje No	2022H03-187262
Proje Adı	Yayın Alımı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama-Bitiş	2022-2022
Proje Tutarı	750.000 TL. (Revize: 3.805.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı ödeneği 750.000 TL. olup, yıl içinde yapılan revizeyle 3.805.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 3.804.113 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz Kütüphanesinde ihtiyaç duyulan basılı ve elektronik yayın alımları yapılmıştır.</p>

Sektör	Eğitim
Proje No	2022H03-186875
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2022-2022
Proje Tutarı	10.000.000 TL. (Revize: 20.000.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, yıl içerisinde yapılan revizelerle 20.000.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 19.402.015 TL.si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %97 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında, Üniversitemiz birimlerinin makine-teçhizat ve mefruşat alımları, bina bakım onarımları, bilgisayar yazılımı ve lisans alımları yapılmıştır.</p>

Sektör	Sağlık
Proje No	2022I00-174929
Proje Adı	Muhtelif İşler
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Makine Teçhizat, Büyük Onarım
Başlama-Bitiş	2022-2022
Proje Tutarı	12.000.000 TL. (Revize: 52.885.000 TL.)
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 12.000.000 TL olup, yıl içinde yapılan revizeyle 52.885.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin 22.606.452 TL.'si harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %43 olmuştur.</p> <p>Proje kapsamında 16.616.931 TL. harcama yapılarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımları yapılmış, 5.989.520 TL. harcama yapılarak hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır.</p>

Sektör	Sağlık
Proje No	2013I00-1855
Proje Adı	Hastane İnşaatı
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Hastane İnşaatı (96.500 m ²), (600 yatak), Makine-Teçhizat
Başlama-Bitiş	2013-2022
Proje Tutarı	333.411.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı yatırım programındaki ödeneği 24.340.000 TL.'dir. Yıl içinde toplam 15.885.244 TL harcama yapılmış ve nakdi gerçekleşmesi %65 olmuştur.</p> <p>İhalesi Üniversitemiz adına TOKİ tarafından 13.05.2014 tarihinde yapılan, sözleşmesi 05.09.2014 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli KDV dahil 153.207.660 TL. olan "Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" için 2022 yılında TOKİ'ye 4.043.810 TL. ödeme yapılarak ödemeler tamamlanmıştır.</p> <p>İhalesi 15.04.2021 tarihinde yapılan yeni hastane binası kantin inşaatı işi için 2022 yılında 89.597 TL. harcama yapılarak iş tamamlanmıştır.</p> <p>Yeni hastane binasında ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve teçhizat alımları için 2022 yılında 11.751.837 TL harcama yapılmıştır.</p>

Resim 6-7: Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Bina



Sektör	DKH-Sosyal (Teknolojik Araştırma)
Proje No	2022K12-186799
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri
Proje Yeri	Konya
Karakteristik	Proje Desteği
Başlama-Bitiş	2022-2022
Proje Tutarı	2.056.000 TL.
Açıklama	<p>Projenin 2022 yılı ödeneği 2.056.000 TL.'dir. Bu ödeneğin tamamı harcanmış ve nakdi gerçekleşme oranı %100 olmuştur.</p> <p>Ödeneğin tamamı Üniversitemiz öğretim elemanlarının yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi amacıyla BAP özel hesabına aktarılmıştır.</p>

2.3- Proje Tamamlama Raporları

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186879			2022H03-186879		
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi			Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.			İnşaatların etüt ve projelendirme işlemlerinin yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Etüt-proje			Etüt-proje		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022			2022-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	200.000	-	-	585.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
2022	-	292.758	-	-	292.758	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-187262			2022H03-187262		
Proje Adı	Yayın Alımı			Yayın Alımı		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.			Üniversitemizde ihtiyaç duyulan yayın alımlarının gerçekleştirilmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı			Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022			2022-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	750.000	-	-	3.805.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)	-	3.804.113	-	-	3.804.113	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186875			2022H03-186875		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Eğitim			Eğitim		
Proje Amacı	Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.			Üniversitemiz hizmet binalarında ihtiyaç duyulan bakım onarımların, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, makine teçhizat alımlarının yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat			Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022			2022-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	10.000.000	-	-	20.000.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)	-	19.402.015	-	-	19.402.015	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022I00-174929			2022I00-174929		
Proje Adı	Muhtelif İşler			Muhtelif İşler		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dış Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımlarının yapılması, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.			Meram Tıp Fakültesi Hastanesi ve Dış Hekimliği Fakültesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz alımlarının yapılması, Hastane eski bloklarında ihtiyaç duyulan bakım-onarım ve tadilatların yapılması.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Makine Teçhizat, Büyük Onarım			Makine Teçhizat, Büyük Onarım		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022			2022-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	12.000.000	-	-	52.885.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)	-	22.606.452	-	-	22.606.452	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2013I000440			2013I00-1855		
Proje Adı	Hastane İnşaatı			Hastane İnşaatı		
Sektör/Alt sektör	Sağlık			Sağlık		
Proje Amacı	60.000 m2 kapalı alana sahip 400 yataklı yeni hastane binası inşa etmek ve makine teçhizat alımını gerçekleştirmek.			96.500 m2 kapalı alana sahip 600 yataklı yeni hastane binası inşa etmek ve makine teçhizat alımını gerçekleştirmek.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Hastane inş.(60.000 m2, 400 yatak), Makine teçhizat			Hastane inş.(96.500 m2, 600 yatak), Makine teçhizat		
Başlama-Bitiş Tarihi	2013-2016			2013-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	135.000.000	-	-	333.411.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2013)	-	-	-	-	-	-
(2014)	-	-	-	-	-	-
(2015)	-	25.814.892	-	-	77.728.665	-
(2016)	-	41.515.161	-	-	116.711.804	-
(2017)	-	81.900.675	-	-	198.145.497	-
(2018)	-	61.340.612	-	-	121.759.610	-
(2019)	-	24.863.224	-	-	41.539.085	-
(2020)	-	12.067.024	-	-	17.455.309	-
(2021)	-	22.182.113	-	-	25.039.450	-
(2022)	-	15.885.244	-	-	15.885.244	-

Projenin Yatırım Programı Parametreleri						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022K12-186799			2022K12-186799		
Proje Adı	Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.			Rektörlük Bilimsel Araşt. Proj.		
Sektör/Altsektör	DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.			DKH-Sosyal-Teknolojik Araşt.		
Proje Amacı	Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.			Üniversitemizde yatırım nitelikli bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi.		
Proje Yeri	Konya			Konya		
Karakteristiği	Proje Desteği			Proje Desteği		
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022			2022-2022		
Proje Tutarı	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
	-	2.056.000	-	-	2.056.000	-
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam	Kamulaştırma	Dış	Toplam	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)	-	2.056.000	-	-	2.056.000	-

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bütçe Türü : Özel Bütçe

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı	2021 Sonu Kümülatif Harcama	2022 Yılı Program Ödenek	2022 Yılı Revize Ödenek	2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme
Tarım						
Madencilik						
İmalat						
Enerji						
Ulaştırma-Hab.						
Turizm						
Konut						
Eğitim	5	226.480.000	140.900.000	53.950.000	124.635.000	103.064.592
Sağlık	2	345.411.000	269.500.000	36.340.000	77.225.000	38.491.697
D.Kamu Hizm.						
-İktisadi						
-Sosyal	1	2.056.000	0	2.056.000	2.056.000	2.056.000
TOPLAM	8	573.947.000	410.400.000	92.346.000	203.916.000	143.612.289

2022 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Eğitim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	2022 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2022 Revize Ödenek	2022 Harcama
2011H03-1423	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	208.530.000	140.900.000	40.000.000	57.630.000		97.630.000	78.046.466
<i>Alt Proje</i>	<i>Mühendislik Fakültesi</i>		2022		<i>208.530.000</i>	<i>140.900.000</i>	<i>40.000.000</i>	<i>57.630.000</i>		<i>97.630.000</i>	<i>78.046.466</i>
								<i>27.630.000 Ek Bütçe</i>			
								<i>30.000.000 Yatırımları Hızlandırma Öd.Akt.</i>			
2021H03-168312	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Konya	7.000.000	0	3.000.000	-385.000		2.615.000	1.519.239
								<i>-385.000 K.İçi Aktarma (-)</i>			
2022H03-186879	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	200.000	0	200.000	385.000		585.000	292.758
								<i>385.000 K.İçi Aktarma (+)</i>			
2022H03-187262	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	750.000	0	750.000	3.055.000		3.805.000	3.804.113
								<i>3.055.000 Likit Ekleme</i>			
2022H03-186875	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000		20.000.000	19.402.015
								<i>10.000.000 Yatırımları Hızlandırma Öd.Akt.</i>			
TOPLAM					226.480.000	140.900.000	53.950.000	70.685.000		124.635.000	103.064.592

2022 YILI YATIRIM GERÇEKLEŞME RAPORU

Kuruluş Adı : NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

(TL)

Sektör Adı : Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	2022 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2022 Revize Ödenek	2022 Harcama
2013I00-1855	Hastane İnşaatı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	333.411.000	269.500.000	24.340.000			24.340.000	15.885.244
		(Döner Sermaye)					(2.340.000)				
Alt Proje	İnşaat	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	214.758.000	192.873.000	12.340.000			12.340.000	4.133.407
		(Döner Sermaye)					(2.340.000)				
Alt Proje	Makina ve Teçhizat Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	118.653.000	76.627.000	12.000.000			12.000.000	11.751.837
2022I00-174929	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	12.000.000	0	12.000.000	40.885.000		52.885.000	22.606.452
								40.885.000 Yatırımları Hızlandırma Öd.Akt.			
TOPLAM					345.411.000	269.500.000	36.340.000	40.885.000		77.225.000	38.491.697

Sektör Adı : DKH - Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tutarı	2021 Kümülatif Harcama	2022 Ödenek	Aktarma Tutarı (+ / -)	Aktarma Türü	2022 Revize Ödenek	2022 Harcama
2022K12-186799	Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.	ÖZEL BÜTÇE	2022	Konya	2.056.000	0	2.056.000			2.056.000	2.056.000
TOPLAM					2.056.000	0	2.056.000	0		2.056.000	2.056.000

GENEL TOPLAM 573.947.000 410.400.000 92.346.000 111.570.000 203.916.000 143.612.289
